

平面図 S=1/20

工事進行【工程】

- ①養生作業  
ブルーシートによる養生（埃防止）
- ②電気工事  
スイッチ、コンセントの移設【横移動500mmくらい】  
Φ3.200Vの一次側配線の新設（既設配電盤～）  
※天井内を配線
- ③解体工事  
片開きドア、木製枠、壁及び下地の解体
- ④上記部分の開口新設  
エアシャワー設置のための開口新設（下地補修）
- ⑤エアシャワーの移設（搬入作業）  
外部コンテナからエアシャワーを移設し設置  
スリッパコートまでは走行リフトが使用可能だが室内（作業室内）はハンドリフト、台車を使用する。  
固定は無し（くらくらつく場合はハンクで調整）  
※エアシャワー本体（動作）の調整は施工後作業
- ⑥上記の電気接続工事  
新設したΦ3.200Vを接続（電源のみの調整）
- ⑦壁の改修  
設置したエアシャワー周りの壁の補修  
既設同程度での仕上（PBに塗装）
- ⑧清掃及び片付け  
清掃確認後引き渡し

現況写真【工事場所】



現況写真【工事場所】



現況写真【工事場所】



現況写真【コンテナ保管：エアシャワー】



現況写真【コンテナ保管：エアシャワー】



現況写真【コンテナ保管：エアシャワー】




現況写真【コンテナ保管：エアシャワー】




現況写真【コンテナ保管：エアシャワー】



現況写真【コンテナ保管：エアシャワー】

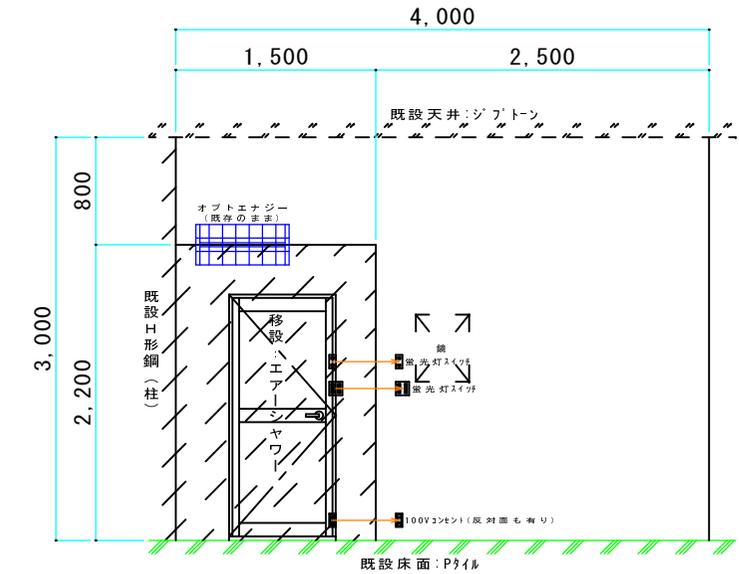

立面図 S=1/20

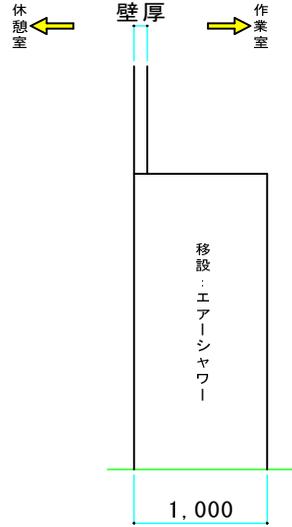

現況写真【コンテナ】



現況写真【搬入口】



現況写真【搬入口内部】



【工事概要】

\*\*\*\*\*様 \*\*\*\*\* TEL:\*\*\*\*\*

工事内容：既存エアシャワー（中古品：外部コンテナに保存）を工場内に新設する工事  
 工事目的：工場の衛生面を強化するため

【施工要領】

- 【工程】土曜日、日曜日の工場休業日による指定工事・駐車場、トイレ、電気、水道は拝借可能
- 【作業】養生・衛生面に注意する事 上履きに履き替え、絆創膏使用 清掃・片付けを徹底
- 【電気】壁面の蛍光灯スイッチx2、100Vコンセントx2（壁両面）の1m程度横移動（移設）、3相200Vの一次側配線（エアシャワー用）の新設
- 【解体】既存の片開きアルミドア（木製三方枠共）、壁（エアシャワー用開口）の撤去及び処分 集塵機の使用
- 【移設】外部コンテナに保管されたエアシャワー（メーカー不明、特注品？）を移設 リフト（※但し内部作業は使用不可）は拝借可能
- 【仕上】既存同等程度（壁：フラスターボード）に塗装仕上げ
